
# ENERGIATTEST

| | |
|---|---|
| Adresse | Hummervegen 27 |
| Postnr | 9104 |
| Sted | KVALØYA |
| Leilighetsnr. | |
| Gnr. | 72 |
| Bnr. | 948 |
| Seksjonsnr. | |
| Festenr. | |
| Bygn. nr. | 300485132 |
| Bolignr. | H0101 |
| Merkenr. | A2015-604723 |
| Dato | 09.10.2015 |

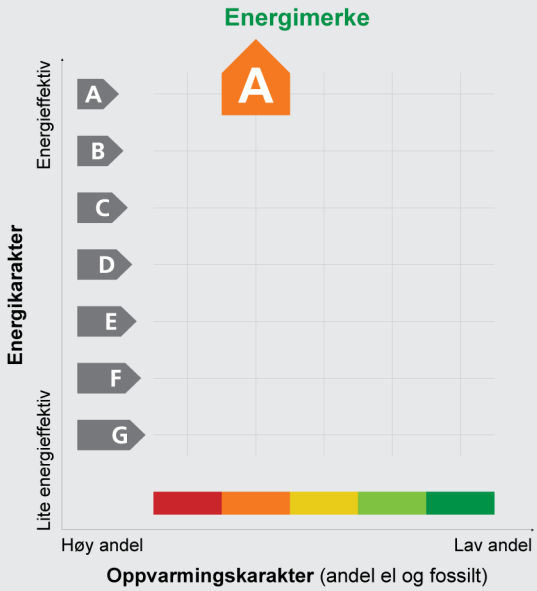


| | |
|---|---|
| Advarsel | Skal bekreftes med lekkasjemåling for å være gyldig |
| Eier | Barlindhaug Eiendom AS |
| Innmeldt av | Byggmesteren Tromsø v/ Geraldine Brun |

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

**Energimerket** angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se **www.energimerking.no**

## Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

## Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet energibehov og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

## Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

Eksperten har ikke angitt tips til brukervaner

## Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi boligen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av boligen eller utskifting av utstyr.

Eksperten har ikke foreslått forbedringstiltak

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

**For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.**

## Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se www.energimerking.no/beregninger

| | |
|---|---|
| **Bygningskategori:** | SMÅHUS |
| **Bygningstype:** | ENEBOLIG |
| **Byggeår:** | 2015 |
| **BRA:** | 146,0 |

**Programvare:** Denne attesten er utstedt basert på opplasting av beregninger utført med programmet TEK-sjekk - 150801

**For oversikt over bygnings-/beregnings-data, se vedlegg 1**

## Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som eier av denne boligen i matrikkelen, eller har fått delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten.

For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny energiattest.

## *Om energimerkeordningen*

*Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 (www.energimerking.no/NS3031)*

*NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet til energimerkeordningen. Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova svarer på tlf. 800 49 003, eller svarer@enova.no*

*Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften, vedtatt desember 2009. og sist endret i januar 2012.*

*Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på www.energimerking.no*

## Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten

**Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)**

Adresse: Hummervegen 27
Postnr/Sted: 9104 KVALØYA
Leilighetsnummer:
Bolignr: H0101
Dato: 09.10.2015 09:53:01
Energimerkenummer: A2015-604723
Ansvarlig for energiattesten: Barlindhaug Eiendom AS
Energimerking er utført av: Byggmesteren Tromsø v/ Geraldine Brun

Gnr: 72
Bnr: 948
Seksjonsnr:
Festenr:
Bygnnr: 300485132

| Enhet | Inngangsverdi |
|---|---|
| Bygningskategori | SMÅHUS |
| Bygningskategori-Id (NVE-Id) | 1 |
| Bygningstype | ENEBOLIG |
| Byggeår | 2015 |
| Areal yttervegger | 203,980 m² |
| Areal tak | 47,000 m² |
| Areal gulv | 46,800 m² |
| Areal vinduer, dører og glassfelt | 29,620 m² |
| Oppvarmet BRA | 146,000 m² |
| Totalt BRA | 146,000 m² |
| Oppvarmet luftvolum | 347,000 m³ |
| U-verdi for yttervegger | 0,200 W/(m²·K) |
| U-verdi for tak | 0,120 W/(m²·K) |
| U-verdi for gulv | 0,117 W/(m²·K) |
| U-verdi for vinduer, dører og glassfelt | 1,000 W/(m²·K) |
| Arealandel for vinduer, dører og glassfelt | 20,288 % |
| Normalisert kuldebroverdi | 0,050 W/(m²·K) |
| Normalisert varmekapasitet | 32,000 Wh/(m²·K) |
| Lekkasjetall | 0,420 1/h |
| Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A) | |
| Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner | 88 % |
| Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. frostsikring | 87 % |
| Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden | 1,400 kW/(m³/s) |
| Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden | 1,400 kW/(m³/s) |
| Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden | 1,200 m³/(m²·h) |
| Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet | 141 % |
| Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri) | 20,925 W/m² |
| Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden | 21 °C |
| Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet | 0 % |
| Settpunkt-temperatur for kjøling | 22 °C |
| Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling | 0,000 W/m² |
| Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP) | 0 kW/(l/s) |

**Bygningsdata:** Vedlegg til energiattesten

**Driftstider, antall timer i døgn med drift**

| | |
|---|---|
| Driftstid ventilasjon | 24 h |
| Driftstid oppvarming | 16 h |
| Driftstid kjøling | 16 h |
| Driftstid lys | 16 h |
| Driftstid utstyr | 16 h |
| Driftstid varmtvann | 16 h |
| Driftstid personer | 24 h |

| | |
|---|---|
| Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden | 1,950 W/m² |
| Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden | 1,950 W/m² |
| Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden | 3,000 W/m² |
| Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden | 1,800 W/m² |
| Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden | 5,100 W/m² |
| Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden | 0 W/m² |
| Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden | 1,500 W/m² |
| Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N) | 0,610 |
| Gjennomsnittlig karmfaktor | 0,015 |
| Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og eventuelle bygningsutspring | 0,661 |
| Oppvarmingssystem(er) | Varmepumpe luft/luft, Dynamisk beregning: Varme til romoppvarming; Helelektrisk bygning (termostatstyrte elektriske radiatorer, varmtvannsbereder, varmebatteri, forbruksstrøm); |
| Varmefordelingssystem | Som beskrevet over |
| Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling | Varmepumpe luft/luft, Dynamisk beregning: Varme til romoppvarming |
| Manuell eller automatisk solskjerming | MANUELL |

**Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet**

| | |
|---|---|
| Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av elektrisk varmesystem (er) | 0,194 |
| Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av varmepumpe | 0,806 |
| Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av solfangeranlegg | 0,000 |
| Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av elektrisk varmsystem(er) | 1,000 |
| Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av elektrisk varmepumpe | 0,000 |
| Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av solfangeranlegg | 0,000 |
| Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem | 0,964 |
| Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg | 2,528 |
| Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg (termisk) | 0,100 |

**Bygningsdata:** Vedlegg til energiattesten

**Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje**

| | |
|---|---|
| Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av et oljebasert varmesystem | 0,000 |
| Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et oljebasert varmesystem | 0,000 |
| Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystem. | 0,100 |

**Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass**

| | |
|---|---|
| Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av et gassbasert varmesystem | 0,000 |
| Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et gassbasert varmesystem | 0,000 |
| Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet. | 0,100 |

**Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme**

| | |
|---|---|
| Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av fjernvarmebasert varmesystem | 0,000 |
| Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av dekkes av et fjernvarmebasert varmesystem | 0,000 |
| Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte varmesystemet. | 0,100 |

**Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel**

| | |
|---|---|
| Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av biobrenselbasert varmesystem | 0,000 |
| Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av dekkes av et biobrenselbasert varmesystem | 0,000 |
| Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbasert varmesystemet. | 0,100 |

**Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert annen energivare**

| | |
|---|---|
| Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som dekkes av varmesystem basert på andre energivarer | 0,000 |
| Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av dekkes av et varmesystem basert på andre energivarer | 0,000 |
| Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre energibærere | 0,100 |

| | |
|---|---|
| Klimastasjon / kilde | Tromsø (Langnes) i Troms |
| Dato for beregning | 20.09.2015 |
| Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene. | |
| Hele bygningen er beregnet | |

**Beregningsprogram**

| | |
|---|---|
| Navn programvare | TEK-sjekk |
| Versjon | 150801 |
| Produsent / leverandør | SINTEF Byggforsk |

**Bygningsdata:** Vedlegg til energiattesten

| | |
|---|---|
| Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk | NS 3031:2014 validert dynamisk timesberegning |

**Energirådgiver**

| | |
|---|---|
| Firma | Byggmesteren Tromsø |
| Navn person | Geraldine Brun |

**Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS**

| | |
|---|---|
| Beregnet levert energi ved normalisert klima | 12645,055 kWh/år |
| Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima | 86,610 kWh/(m²·år) |
| Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima | 7827,639 kWh/år |
| Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima | 91,217 kWh/(m²·år) |
| Beregnet levert energi ved lokalt klima | 13317,680 kWh/år |

**Målt energibruk (levert energi) pr. år, gjennomsnitt for siste tre år.**

| | |
|---|---|
| Elektrisitet | 0,000 kWh/år |
| Olje | 0,000 liter/år |
| Gass | 0,000 Sm³/år |
| Fjernvarme | 0,000 kWh/år |
| Biobrensel | 0,000 kg/år |
| Annen energivare | 0,000 kWh/år |
| Totalt | 0,000 kWh/år |

**Beregnet levert energi ved normalklima**

| | |
|---|---|
| Elektrisitet | 12645,055 kWh/år |
| Olje | 0,000 kWh/år |
| Gass | 0,000 kWh/år |
| Fjernvarme | 0,000 kWh/år |
| Biobrensel | 0,000 kWh/år |
| Annen energivare | 0,000 kWh/år |
| Totalt | 12645,055 kWh/år |

| | |
|---|---|
| Sum andel elektrisitet, olje og gass | 73,2 % |
